


แผน / ผลดำเนินการบำรุงรักษาถนนโครงข่ายทางหลวงชนบท ปีงบประมาณ 2559

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2559

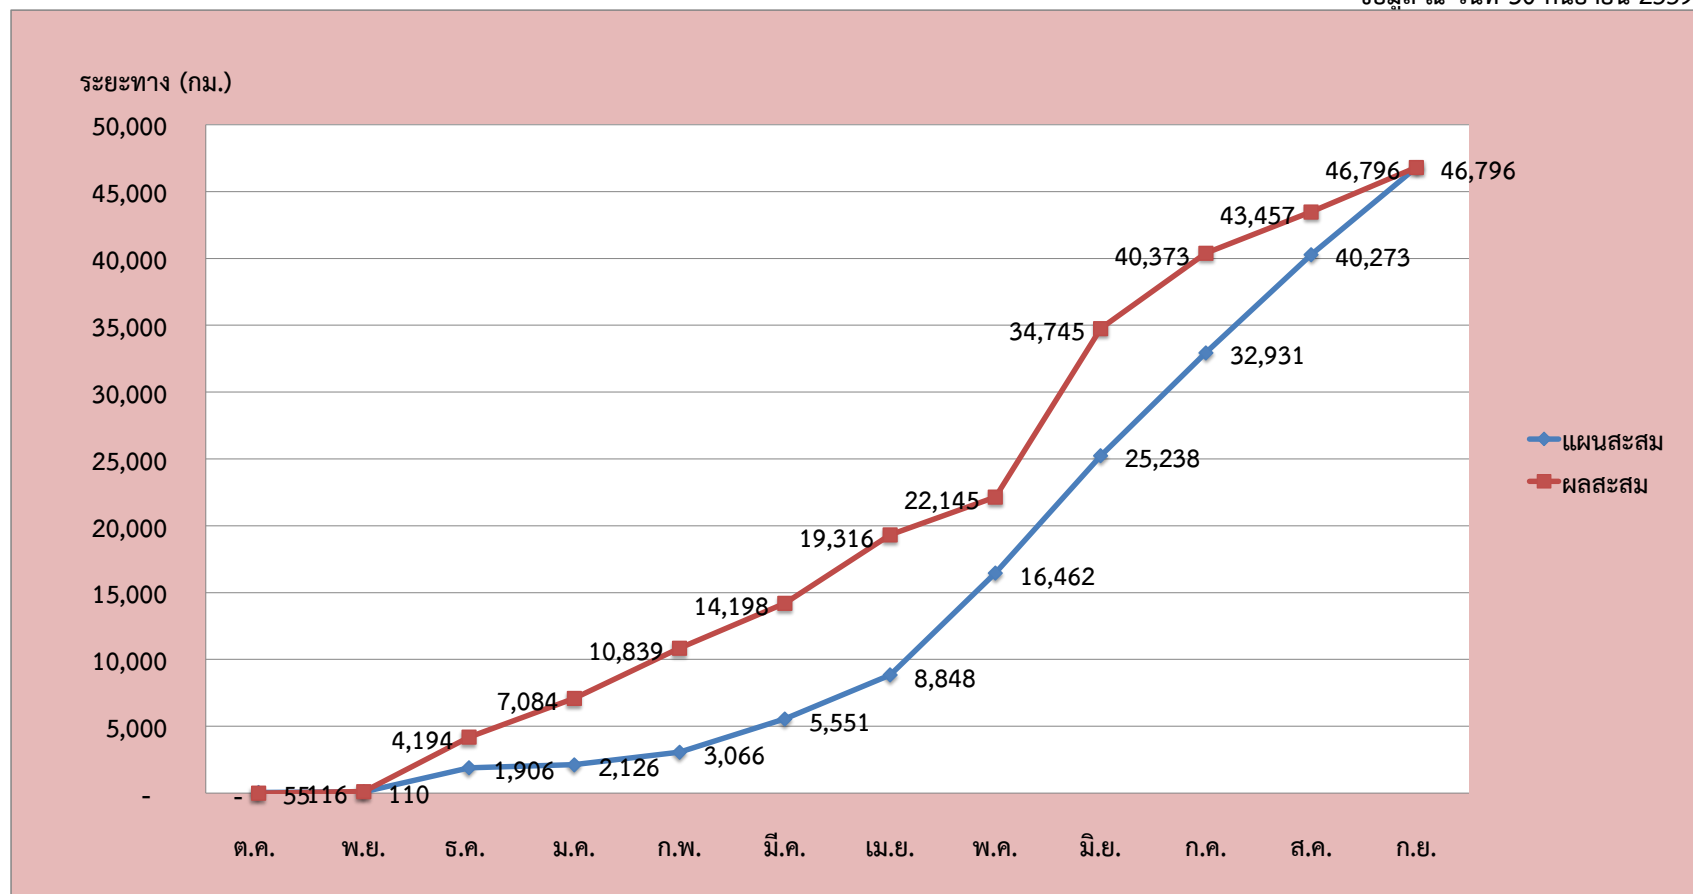

เดือน		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
แผนสะสม	(กม.)	55	110	1,906	2,126	3,066	5,551	8,848	16,462	25,238	32,931	40,273	46,796
	(%)	0.12	0.24	4.07	4.54	6.55	11.86	18.91	35.18	53.93	70.37	86.06	100.00
ผลสะสม	(กม.)	-	116	4,194	7,084	10,839	14,198	19,316	22,145	34,745	40,373	43,457	46,796
	(%)	-	0.25	8.96	15.14	23.16	30.34	41.28	47.32	74.25	86.28	92.86	100.00
